Kebijakan Pelaporan dan Pemantauan Direktorat Jenderal Cipta Karya

Disampaikan dalam rangka Midterm Review Kegiatan Tahun 2014 Dan Penyusunan RKA-KL Tahun 2015 Direktorat Pengembangan Permukiman

Jakarta, 1 September 2014





Outline

- a. Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan TA 2014
- b. Isu dan Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan TA 2014
- c. Permasalahan Progres Pelelangan dan Pelaksanaan Kegiatan TA 2014
- d. Dana Blokir

Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan TA 2014

Dasar Hukum

- PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
 (Mewajibkan penyampaikan laporan SAK dan SIMAK BMN secara periodik semesteran).
- PP No. 39/2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

(Mewajibkan semua K/L menyampaikan laporan Konsolidasi Program secara periodik triwulanan)

 Permen PU No. 14/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum Yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri.

(Pedoman Pelaksanaan Anggaran Satker Pusat Kem. PU)

 Permen PU No. 15/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

(Pedoman Pelaksanaan Anggaran SKPD Dekon/TP Kementerian. PU)

Tugas Petugas e-Monitoring Satker

Sesuai Permen PU 14/2011

- Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi :
 - (a) Rekaman **DIPA dan POK** yang telah disahkan
 - (b) Rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
 - (c) Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progres fisik dan realisasi keuangan)
 - (d) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja
 - (e) Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.

- 2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada perubahan informasi dan mengirim backup data melalui e-Monitoring online
- 3) Melakukan **pemutakhiran** aplikasi e-Monitoring off-line




- Menyusun dan menyampaikan laporan progres fisik dan keuangan secara periodik sesuai ketentuan.
- 5) Meminta persetujuan pelaporan kepada Kasatker sebelum mengirimkan backup ke e-Monitoring online

Tanggungjawab:

- Bertanggungjawab atas kebenaran materi Laporan Pelaksanaan Kegiatan (backup data maupun cetakan)
- Bertanggungjawab kepada Kasatker

Alur Proses Pelaporan e-MonitorinG Satuan Kerja

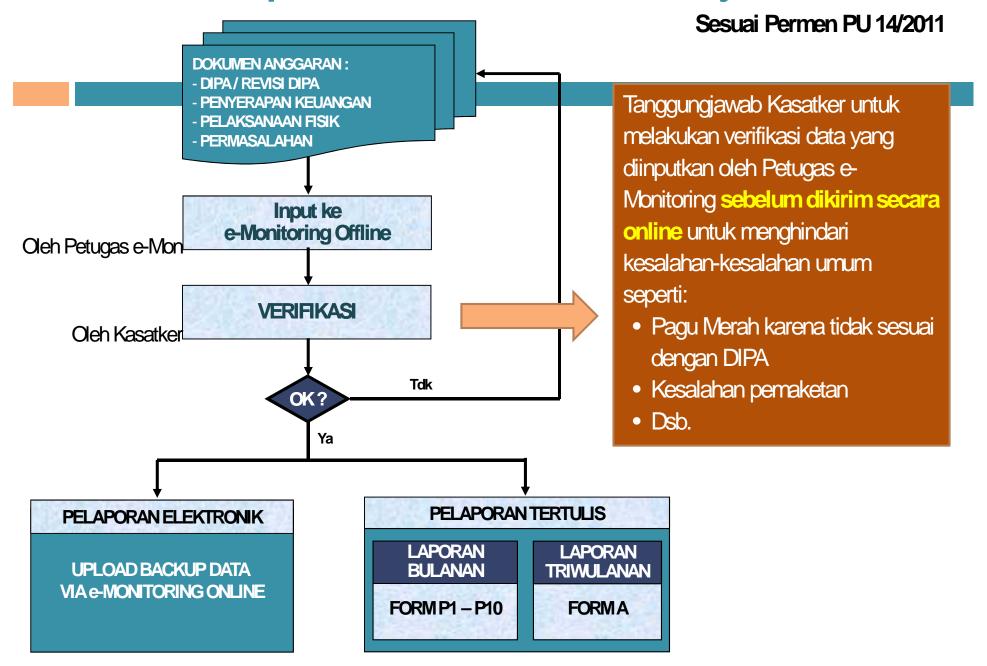

Isu & Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan TA 2014

Permasalahan Pelaporan TA 2014

PAGU KUNING

Petugas emon Satker agar memeriksa kembali hasil backup yang dikirimkannya ke e-Mon online untuk memastikan pagu sesuai. Petugas Randal Provinsi (dibantu KI Pemantauan) agar dapat lebih aktif melakukan pemantauan dan mengecek serta menjaga pagu e-Monitoring Satker-Satker di wilayahnya (Satker Provinsi maupun Kab/Kota) setiap hari. Jika Randal membantu menyesuaikan Pagu Satker Kab/Kota, harap informasikan kepada Petugas Kab/Kota untuk tidak lagi mengirim data dengan backup lama (download backup dari e-Monitoring online terlebih dahulu)

PEMAKETAN EMON – EPROC

Masih terdapat perbedaan pagu RUP dan pemaketan antara e-Monitoring dan e-Procurement. Petugas e-Procurement dan e-Monitoring perlu bekerja sama menghapus paket dibatalkan dari tayangan RUP, upload ulang backup e-Monitoring dan update/refresh RUP. Mengingat Revisi DIPA APBN-P TA 2014 telah terbit per 17 Juli 2014, maka seharusnya semua perbedaan pemaketan yang disebabkan oleh lelang dini sudah dapat diselesaikan



Permasalahan Pelaporan TA 2014 (2)

✓ OUTPUT

Masih terdapat perbedaan antara output yang diinputkan dalam e-Monitoring, output dalam dokumen RKA-KL, serta output dalam dokumen PK (Penilaian Kinerja). Satker agar menyamakan total nilai dukungan output dari paket dengan volume output dalam DIPA.

✓ SPM-SP2D

Realisasi keuangan dilaporkan berdasarkan penerbitan SPM, namun SP2D harus segera diinputkan begitu terbit. Demikian pula untuk SP2D yang ditolak, agar SPMnya segera dihapus dari data e-Monitoring, agar di akhir tahun anggaran SPM dan SP2D harus sama.

PROGRES LELANG

Masih terdapat data progres lelang yang tidak terupdate baik di e-Procurement maupun e-Monitoring, agar petugas e-Procurement dapat segera mengupdate data progres lelang, antara lain untuk paket proses lelang yang masih tercantum sebagai paket belum lelang dan paket terkontrak yang masih tercantum sebagai paket proses lelang.



Permasalahan Pelaporan TA 2014 (3)

PEMBERDAYAAN

Mengingat telah dimulainya kegiatan-kegiatan Pemberdayaan di Kab/Kota (PPIP, P2KP, PISEW, Pamsimas, Sanimas, 3R), maka dimohon kepada Randal Provinsi untuk memantau dan mengingatkan kepada petugas e-Monitoring Kab/Kota untuk **segera merinci pemaketan dalam e-Monitoring** sesuai dengan kriteria sbb:

- Untuk P2KP, PPIP Reguler, RIS, dan Sanimas, pemaketan dapat dilakukan per kelurahan/ per desa, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dirinci dengan dipisahkan tanda koma (,) dimulai dari pekerjaan yang paling besar. Contoh: "Pembangunan Talud, Jalan Rabat Beton, dan Pelatihan Masyarakat Desa Muara Lawe Bulan Kec. Babussalami"
- 2. Untuk RISE/PISEW dan Pamsimas, pemaketan dipisahkan per kontrak/per kegiatan. Contoh: "Pembangunan Irigasi Talian Dung Naroh Sta 000 Sta 133 Desa Sitinjo I Kec. Sitinjo"

Arahan Direktur Jenderal Cipta Karya

THINGS TO DO:

(sesuai Hasil Rapim Kemen PU 4 Agustus 2014)

- 1. Perlu dilakukan peningkatan upaya percepatan progres kegiatan secara signifikan pada bulan Agustus-September agar tidak membebani intensitas kegiatan pada Oktober-Desember 2014
- Laporan Progres DJCK disampaikan secara mingguan setiap hari Senin kepada Dirjen Cipta Karya
- 3. Proses lelang paket-paket yang belum terkontrak agar dilakukan secara berhati-hati dan mengikuti ketentuan yang berlaku, serta dilakukan upaya mitigasi untuk mencegah terjadinya proses sanggah dan lelang ulang

Arahan Direktur Jenderal Cipta Karya (*Lanjutan*)

- 5. Melakukan **update data** ke dalam e-Monitoring secara intensifuntuk setiap kemajuan pelaksanaan kegiatan dengan **tanpa** menunda
- 6. Melengkapi data dukung untuk memproses pengajuan **usulan untuk paket-paket kegiatan multiyears**
- 7. Melengkapi Rencana Umum Pengadaan (RUP) di e-Procurement agar sesuai dengan pagu DIPA TA 2014 dan data paket kegiatan e-Monitoring.


Arahan Direktur Jenderal Cipta Karya (*Lanjutan*)

RENCANA PROYEK YANG SIAP DIRESMIKAN:

- Perlu dilakukan penyusunan daftar rencana kegiatan DJCK yang siap diresmikan, meliputi:
 - Kegiatan yang akan diresmikan pada Agustus- Oktober 2014
 - Kegiatan yang akan diresmikan pada November-Desember 2014
- ☐ Kegiatan-kegiatan yang diusulkan agar memiliki kualitas hasil pekerjaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan
- Pada setiap hasil kegiatan 2014 yang siap diresmikan agar sudah disiapkan dan dipasang logo PU yang terstandar, yang baik, permanen, tahan lama, dan ditempatkan secara tepat.

Permasalahan Progres Pelelangan dan Pelaksanaan Kegiatan TA 2014


Gambaran Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan Kementerian PU

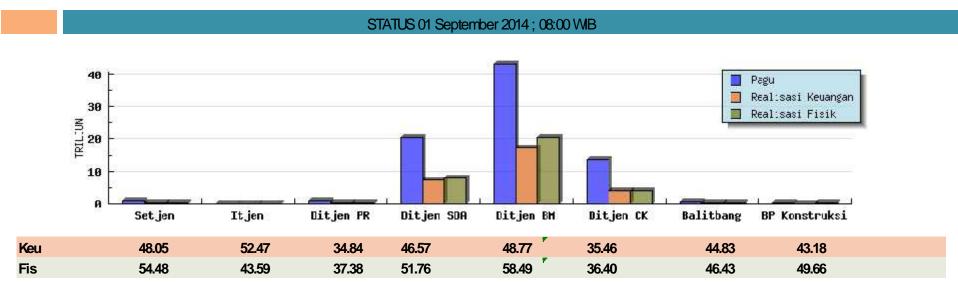

NO	UNIT ORGANISASI	P/	AGU e-Monitoring	(Rp Ribu)			REALISASI (Rp	Ribu)		FISIK
140		RPM	PLN	TOTAL	%	RPM	PLN	TOTAL	%	(%)
1	SETJEN	813.971.746	0	813.971.746	1.09	391.104.242	0	391.104.242	48.05	54.48
2	ITJEN	85.604.248	0	85.604.248	0.11	44.912.391	0	44.912.391	52.47	43.59
3	DITJENTARU	975.069.011	0	975.069.011	1.30	339.693.183	0	339.693.183	34.84	37.38
4	DITJEN SDA	15.827.811.084	2.627.707.199	18.455.518.283	24.68	7.454.849.253	1.140.408.672	8.595.257.925	46.57	51.76
5	DITJEN BM	37.280.707.393	2.215.563.991	39.496.271.384	52.81	18.342.753.727	918.014.456	19.260.768.183	48.77	58.49
6	DITJEN CK	10.936.147.257	3.195.243.005	14.131.390.262	18.90	4.273.656.336	736.724.458	5.010.380.794	35.46	36.40
7	BALITBANG	483.763.714	0	483.763.714	0.65	216.876.731	0	216.876.731	44.83	46.43
8	BP KONSTRUKSI	345.522.754	0	345.522.754	0.46	149.191.050	0	149.191.050	43.18	49.66
	TOTAL	66.748.597.207	8.038.514.195	74.787.111.402	100.00	31.213.036.913	2.795.147.586	34.008.184.499	45.47	52.22


SANDINGAN PROGRES TA 2013 DAN TA 2014 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

TA 2 01 Septem		TA 20 STATUS 01 Septen	
KEU	FIS	KEU	FIS
29.39	29.50	35.46	36.40



			Progres TA 2013				Progres TA 2014		
NO	DIREKTORAT		1-Sep-13			STATUS 01	September 2014	; 08:00 W	IB
INO	BRENIONAL	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	KEU (%)	FISIK (%)	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	KEU (%)	FISIK (%)
1	Direktorat PAM	7.512.685.222	2.688.154.809	35.78	29.60	4.640.398.964	1.928.627.238	41.56	43.11
2	Direktorat PPLP	2.972.469.740	1.108.352.368	37.29	41.80	2.339.937.039	920.205.073	39.33	44.62
3	Direktorat Bangkim	7.013.402.605	1.263.055.957	18.01	32.83	2.673.928.472	1.081.336.400	40.44	44.33
4	Direktorat PBL	1.821.236.653	649.867.933	35.68	28.77	1.579.246.211	574.896.765	36.40	36.45
5	Direktorat Bina Program	286.764.453	124.638.875	43.46	42.81	264.773.669	129.715.002	48.99	49.37
6	Setditjen Cipta Karya	303.463.847	85.440.809	28.16	10.57	235.744.626	60.266.430	25.56	25.54
7	BPPSPAM	43.928.766	24.308.860	55.34	49.52	61.762.800	35.821.150	58.00	58.00
8	Pemberdayaan Masyarakat	2.514.824.612	659.134.395	26.21	6.28	2.335.598.481	279.512.737	11.97	4.76
	TOTAL	22.468.775.898	6.602.954.006	29.39	29.50	14.131.390.262	5.010.380.795	35.46	36.40

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2014

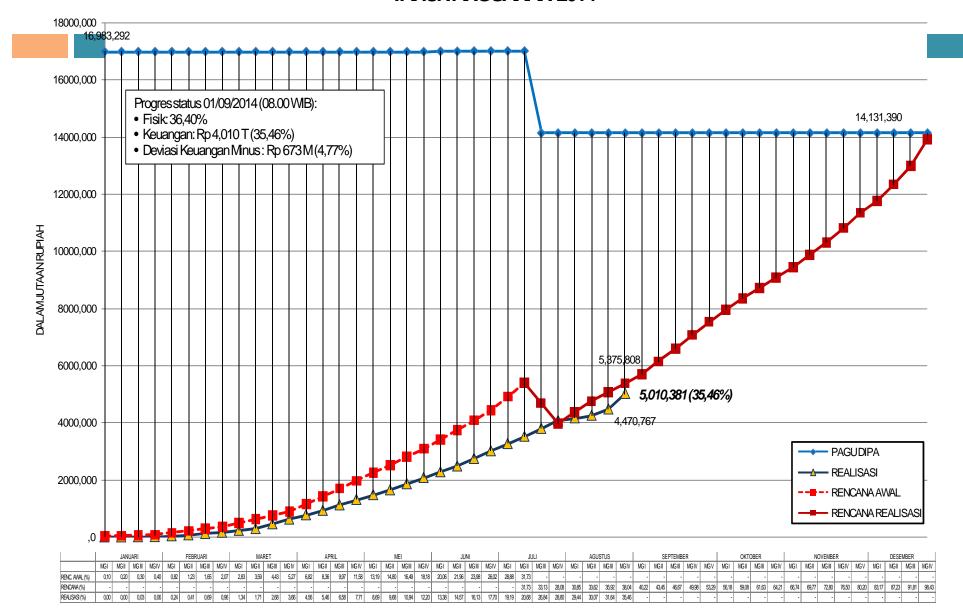

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2014 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS DATA: 1 SEPTEMBER 2014; 08.00 WIB

10	NAMA DIREKTORAT	KUPIAH	PLN	PAGU	1 SEPTEMBER	9200		A ISI	LISASI			DEVIASI	
`	indicate of the second	MURNI	P.L.N	7700	KEUANGAI	•	RHPIAH	PHLN	TOTAL	KEU	FISIK	KEUANGAI	N
4					(RP)	%	MURNI	PHLN	IOIAL	%	%	(RP)	%
	SATKER PUSAT DAN PROPINSI :	10.693.377.545	1.102.414.236	11.795.791.781	5.129.980.218	43.49	4.268,706,336		4.730,868,058	40.11	42.66	(1.988.728.521)	(16.80
1	DIT. FENGEMBANGAN AIR MINUM	4.562.223.660	78.175. <mark>30</mark> 4	4.640.398.964	2.053.495.074	44.25	1.888.504.882	40,122,356	1.928.627.238	41.56	43.11	(124.867.836)	(2.6
2	DIT. PENGEMBANGAN PLP	2.093.898.520	246.038.519	2.339.937.039	1.128.937.586	48.25	849.238,790	70.966,284	920.205.073	39.33	44.62	(208.732.513)	(8.92
3	DIT.PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	2.481.660.472	192,268,000	2 673 928.472	1.071.395.601	40.07	1.057.065.643	24.270.757	1.081.336.400	40.44	44.33	9.940.800	0.3
4	DIT. PENATAAN BANGUNAN & LINGK.	1.053.313.798	525,932.413	1.579.246.211	609.152.931	38.57	248 094.440	326.802.325	574.896.765	36.40	36.45	(34.256.166)	(2.1
5	DIT. BINA PROGRAM	264.773.669	*	264.773,669	144.734.847	54,66	129.715.002	**	129.715.002	48.99	49.37	(15. <mark>0</mark> 19.84 <mark>5</mark>)	(5.6
6	SETDITJEN CIPTA KARYA	175.744.626	50.000.000	235.744.626	83.707.751	35.51	60.266,430	*	60.266.430	25,56	25.54	(23,441,321)	(9.9
7	BPPSPAM	61.762,800		61.762.800	38.556.429	62.43	35.821.150	•	35.821.150	58.00	58.00	(2.735.279)	(4.4
8	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	241.769.712	2.093.828.769	2.335.598.481	553.787.081	23.71	4.950.000	274.562.737	279.512.737	11.97	4.76	(274.274.345)	(11.7
833	- P2K P	93,269,712	1.140.806.587	1.234.076.299	362.315.000	29.36	1906 BSM 88AB S	255.558.875	255.558.875	20.71	8.48	(106.756.125)	(8.6
	• PPIP	148.500.000	25.000.000	173.500.000			4.950.000	(0)25224((0)2 <u>1</u>	4.950.000	2.85		4.950 000	2.8
	- PAMSIMAS	-	288,915,696	288.915.696	44.266,339	15.32	-	5 .9 61. 000	5.961.000	2.06	1.01	(38,306,340)	(13.2
	- RISE		423,500,000	423.500.000	84.700.000	20.00		(#75000000000000000000000000000000000000				(84.700.000)	(20.0
	- SANIMAS	•	215.606.486	215.606.486	62.505.742	28.99		13.042.862	13.042.862	6.05	1.67	(49. 462.880)	(22.9
	nescorer 19110e 173-277.03110 (FTX-27 14611500 1704) (M. 1501)		ngi istawa Mati Istaw		~~		·		via: 1044/00/00/00/114/00/0	77.375		C-0410000-08116110-900	C.

Sandingan e-Monitoring dan e-Procurement Direktorat Pengembangan Permukiman

Status 29 Agustus 2014, Pukul 08.00

																				,							
									el	MONITO											eP	ROCURE		ua w			
NO	UNIT ESELON 2/ PROGRAM	PAGU DIPA	PAGU RUP TERTAYANG	PAKET	Kontraktual		AKET BELUM LELANG	PA	KET PROSES LELANG	PELA	PAKE	T TERKONTRAK			ET MULTIYEARS LANJUTAN	PAKET	Kontraktual		KET BELUM LELANG	PAKET	PROSES LELANG	PELA	SANAAN KONTRA PAKET	TTERKONTRAK			ET MULTIYEARS LANJUTAN
				PKT	Rp	PKT	Rp	PKT	Rp	PKT	PAGU TERKONTRAK	NILAI KONTRAK	SISA KONTRAK	PKT	RP	PKT	Rp	PKT	Rp	PKT	Rp	PKT	PAGU TERKONTRAK	NILAI KONTRAK	SISA KONTRAK	PKT	RP
1	DIT. PAM	4.640.398.964	4.224.075.686	1.803	4.256.818.006	45	58.352.769	299	736.265.675	1.440	3.265.462.925	3.162.307.518	103.155.407	19	196.736.637	1.678	3.997.939.703	81	257.252.889	322	802.521.746	1.257	2.823.989.462	2.659.204.534	164.784.928	18	114.175.606
2	DIT. PPLP	2.339.937.039	2.311.659.531	987	1.954.966.118	13	51.529.962	51	69.299.888	900	1.577.245.094	1.519.167.447	58.077.647	23	256.891.174	988	1.892.909.801	46	88.559.213	91	165.853.977	832	1.442.879.437	1.359.106.521	83.772.917	19	195.617.174
3	DIT. BANGKIM	2.673.928.472	2.812.909.502	1.233	1.974.942.259	51	159.136.148	194	102.451.889	905	732.651.220	700.492.503	32.158.717	83	980.703.002	1.254	2.018.409.952	59	166.983.273	163	51.505.253	951	795.971.823	744.821.261	51.150.562	81	1.003.949.603
4	DIT. PBL	1.579.246.211	1.978.742.565	464	820.458.308	25	76.387.440	58	52.030.297	342	585.787.351	531.263.071	54.524.280	39	106.253.220	490	868.723.079	32	120.352.603	108	137.449.603	307	500.428.080	444.602.900	55.825.180	43	110.492.793
5	DIT. BINA PROGRAM	264.773.669	260.571.584	379	81.615.621	-	-	2	1.700.000	377	79.915.621	79.350.353	565.268	-	-	366	80.696.351	-	-	2	1.700.000	364	78.996.351	78.137.659	858.691	-	-
6	SETIDITJEN	235.744.626	238.164.626	72	37.178.139	24	14.427.563	4	4.806.335	44	17.944.241	17.367.074	577.167	-	-	70	35.833.478	22	8.903.163	20	13.783.350	28	13.146.965	13.039.311	107.654	-	-
7	BPPSPAM	61.762.800	65.539.554	42	27.296.627	-	-	-		42	27.296.627	27.296.621	6	-	-	42	29.365.325	-	-	-	-	42	29.365.325	27.296.614	2.068.711	-	-
8	PEMBERDAYAAN	2.335.598.481	2.668.311.413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	14.131.390.262	14.559.974.461	4.980	9.153.275.078	158	359.833.882	608	966.554.084	4.050	6.286.303.079	6.037.244.587	249.058.492	164	1.540.584.033	4.888	8.923.877.689	240	642.051.141	706	1.172.813.929	3.781	5.684.777.443	5.326.208.799	358.568.644	161	1.424.235.176

Catatan

Hasil pantauan Direktorat Bina Program masih terdapat perbedaan jumlah paket belum lelang antara e-Monitoring dan e-Procurement

Dit. Bangkim: e-Monitoring (59 paket) dan e-Procurement (81 paket)

⁻ Sesuai Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/SE/M/2012, pagu RUP memuat pagu seluruh paket kegiatan sesuai DIPA termasuk pekerjaan Administrasi Umum dan Swakelola

⁻ Data paket kontraktual e-Procurement telah termasuk paket pelelangan dini yang masih dalam update data revisi DIPA

Sandingan e-Monitoring dan e-Procurement Direktorat Pengembangan Permukiman

Status 29 Agustus 2014, Pukul 08.00

									e-MO	NTORIN	I G										ePRO	CUREM	ENT				
										PELAKS	SANAAN KONTRA	KTUAL										PELAK	SANAAN KONTRA	AKTUAL			
NO	SATUAN KERJA	PAGU DIPA	PAGU RUP TERTAYANG	PAKET	ONTRAKTUAL		KET BELUM LELANG		ET PROSES LELANG		PAKET	TERKONTRAK			MULTIYEARS Anjutan	PAKET	KONTRAKTUAL		ÆT BELUM LELANG		ŒT PROSES LELANG		PAKET	TERKONTRAK			T MULTIYEARS .anjutan
			IERIAIANG	PKT	Rp	PKT	Rp	PKT	Rp	PKT	PAGU TERKONTRAK	NILAI KONTRAK	SISA KONTRAK	PKT	RP	PKT	Rp	PKT	Rp	PKT	Rp	PKT	PAGU TERKONTRAK	nilai Kontrak	SISA Kontrak	PKT	RP
A	PUSAT	1.855.584.126	1.976.683.570	226	1.326.380.473	38	158.296.148	41	78.772.017	64	108.609.306	97.491.638	11.117.668	83	980.703.002	233	1.352.944.786	40	158.611.798	29	23.753.839	83	166.629.546	155.637.900	10.991.646	81	1.003.949.603
1	DIT. BANGKIM	68.336.324	67.806.424	20	19.391.018	-	-	2	1.300.000	18	18.091.018	18.091.018		-		20	19.523.538	-	-	2	1.350.000	18	18.173.538	16.500.284	1.673.254	-	
2	PKP PERKOTAAN STRATEGIS	1.213.480.588	1.231.443.127	171	1.194.891.138	35	156.570.428	30	13.472.330	26	55.925.378	48.741.458	7.183.920	80	968.923.002	179	1.221.163.248	38	157.261.798	26	10.697.839	37	61.034.008	53.225.058	7.808.950	78	992.169.603
3	PKP PERDESAAN STRATEGIS	100.101.987	203.768.792	21	87.278.317	1	375.720	9	63.999.687	11	22.902.910	19.587.536	3.315.374	-		20	87.438.000	-	-	1	11.706.000	19	75.732.000	75.193.537	538.463	-	-
4	PPIP	473.665.227	473.665.227	14	24.820.000	2	1.350.000	-		9	11.690.000	11.071.626	618.374	3	11.780.000	14	24.820.000	2	1.350.000	-	•	9	11.690.000	10.719.022	970.979	3	11.780.000
B.	WLAYAHI	381.190.660	384.788.618	523	290.913.397	2	224.000	90	16.470.272	431	274.219.125	265.514.959	8.704.166			530	302.428.557	11	5.221.475	80	16.640.272	439	280.566.810	257.810.629	22.756.181	-	
1	PKPPNAD	22.293.065	22.293.065	18	16.421.980	-	-	-		18	16.421.980	16.257.690	164.290	-	-	18	16.421.980	-				18	16.421.980	16.257.690	164.290	-	
2	PKPP SUMATERAUTARA	27.444.591	27.444.591	39	22.540.986	-	-	4	894.904	35	21.646.082	20.687.289	958.793	-		40	23.961.986	1	1.421.000	4	894.904	35	21.646.082	20.687.289	958.793	-	
3	PKPSUMATERABARAT	23.905.079	23.905.079	31	19.440.048	-	-	12	672.000	19	18.768.048	17.423.872	1.344.176	-		31	21.710.061	-		11	616.000	20	21.094.061	17.479.872	3.614.189	ı -	
4	PKPPRIAU	26.361.836	26.361.836	25	16.724.208	-	-	-		25	16.724.208	16.668.223	55.985	-		25	16.724.208	-				25	16.724.208	15.816.550	907.658	-	
5	PKPPKEPULAUAN RIAU	22.834.462	22.834.462	28	18.876.743	-		-		28	18.876.743	18.860.382	16.361	-		28	18.876.743	-				28	18.876.743	17.664.121	1.212.622	ı -	
6	PKPJAMBI	25.674.297	25.674.297	34	20.377.031	-	-	5	280.000	29	20.097.031	20.029.602	67.429	-		34	23.100.509	-				34	23.100.509	15.792.976	7.307.533	-	
7	PKPBENGKULU	22.290.294	22.140.590	22	17.596.660	-	-	1	56.000	21	17.540.660	17.536.755	3.905	-		22	18.104.722			1	56.000	21	18.048.722	17.536.755	511.967	-	
8	PKP SUMATERA SELATAN	34.270.996	34.270.996	30	22.324.545	-	-	-		30	22.324.545	21.968.377	356.168	-		30	22.656.817	-		-		30	22.656.817	21.977.378	679.439	-	
9	PKPBANGKABELITUNG	19.649.137	19.649.137	30	16.591.220	-	-	5	280.000	25	16.311.220	15.145.260	1.165.960	-		30	16.591.220	-	-	-	-	30	16.591.220	15.422.860	1.168.360	-	
10	PKPLAMPUNG	28.633.860	28.991.970	30	18.264.369	1	56.000	2	112.000	27	18.096.369	18.095.819	550	-		30	18.572.479	1	56.000	2	112.000	27	18.404.479	17.946.739	457.740		
11	PKPBANTEN	21.737.915	25.076.890	39	17.899.368			29	11.543.368	10	6.356.000	5.712.919	643.081	-		45	21.238.343	6	3.338.975	28	10.249.368	11	7.650.000	6.823.477	826.523]	-
12	PKPJAWABARAT	26.897.679	26.897.679	26	21.779.522	-		2	952.000	24	20.827.522	19.012.351	1.815.171	-		26	21.779.522		-	4	3.032.000	22	18.747.522	17.137.813	1.609.709		
13	PKPJAWATENGAH	30.360.392	30.410.964	72	23.783.787	-		-		72	23.783.787	23.298.373	485.414	-		72	23.783.787	-		-		72	23.783.787	23.257.085	526.702	-	
14	PKP DI YOGYAKARTA	21.789.115	21.789.120	41	17.648.300	1	168.000	-		40	17.480.300	17.448.513	31.787	-		41	17.648.300	1	168.000			40	17.480.300	16.814.924	665.376		
15	PKPJANATIMUR	27.047.942	27.047.942	58	20.644.630		-	30	1.680.000	28	18.964.630	17.369.534	1.595.096	-		58	21.257.880	2	237.500	30	1.680.000	26	19.340.380	17.195.101	2.145.279		

Sandingan e-Monitoring dan e-Procurement Direktorat Pengembangan Permukiman

Status 29 Agustus 2014, Pukul 08.00

									e-MON	ITORIN	IG										e-PRO	CUREM	ENT				
									P	ELAKS	ANAAN KONTRA	KTUAL										PELAKS	SANAAN KONTRA	AKTUAL			
NO	SATUAN KERJA	PAGU DIPA	PAGU RUP TERTAYANG	PAKET	ONTRAKTUAL		ÆT BELUM LELANG		ET PROSES LELANG		PAKET	TERKONTRAK			MULTIYEARS Anjutan	PAKET	(ONTRAKTUAL		ET BELUM Elang		ET PROSES LELANG		PAKET	TERKONTRAK			T MULTIYEARS Lanuutan
			IERIAIANG	PKT	Rp	PKT	Rp	PKT	Rp	PKT	PAGU TERKONTRAK	NILAI Kontrak	SISA KONTRAK	PKT	RP	PKT	Rp	PKT	Rp	PKT	Rp	PKT	PAGU TERKONTRAK	NILAI Kontrak	SISA KONTRAK	PKT	RP
C.	WLAYAHII	437.153.686	451.437.314	484	357.648.389	11	616.000	ස	7.209.600	410	349.822.789	337.485.906	12.336.883			491	363.036.609	8	3.150.000	54	11.111.142	429	348.775.467	331.372.732	17.402.735	-	
1	PKPP KALIMANTAN BARAT	4.783.656	22.234.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8	3.150.000	8	3.150.000	-	-	-	-	-	-	-	
2	PKPKALIMANTANTENGAH	24.612.132	24.612.132	21	20.189.068	-		-	-	21	20.189.068	19.084.515	1.104.553	-	-	21	20.189.068	-		-	-	21	20.189.068	20.120.088	68.980	-	-
3	PKPKALIMANTAN SELATAN	22.466.871	23.639.775	18	17.806.410	-	-	-	-	18	17.806.410	17.781.487	24.923	-		18	19.337.739	-		1	850.000	17	18.487.739	16.921.487	1.566.252	-	-
4	PKPP KALIMANTAN TIMUR	22.185.036	22.275.036	24	17.709.147	-	-	8	448.000	16	17.261.147	16.346.929	914.218	-		24	17.709.147	-		8	448.000	16	17.261.147	16.346.929	914.218	-	-
5	PKPP SULAWESI UTARA	57.275.669	46.388.909	65	51.107.068	-	-	13	728.000	52	50.379.068	47.897.076	2.481.992	-		65	51.107.068	-		13	728.000	52	50.379.068	47.897.076	2.481.992	-	-
6	PKPGORONTALO	20.615.166	20.615.166	26	16.676.536	-	-	2	2.000.000	24	14.676.536	13.537.406	1.139.130	-		26	16.676.536	-		8	2.336.000	18	14.340.536	13.309.906	1.030.630	-	-
7	PKP SULANESI TENGAH	18.832.686	25.289.276	28	15.674.551	11	616.000	2	1.700.000	15	13.358.551	12.079.909	1.278.642	-		28	16.535.463	-		4	4.837.260	24	11.698.203	9.653.553	2.044.651	-	-
8	PKP SULANESI SELATAN	28.735.136	28.735.136	42	24.173.367	-	-	-	-	42	24.173.367	20.643.586	3.529.781	-		42	24.173.367	-		-	-	42	24.173.367	19.208.943	4.964.424	-	-
9	PKP SULAWESI BARAT	22.216.873	22.216.873	23	18.365.311	-		-	-	23	18.365.311	18.173.321	191.990	-		23	18.365.311	-		-		23	18.365.311	18.173.321	191.990	-	-
10	PKP SULAWESI TENGGARA	33.787.996	33.787.996	39	29.508.138	-	-	17	1.113.600	22	28.394.538	28.303.418	91.120	-		38	29.383.738	-		11	616.000	27	28.767.738	27.715.888	1.051.850	-	-
11	PKPBALI	23.606.760	23.606.760	29	18.302.495	-	-	5	280.000	24	18.022.495	17.725.261	297.234	-		29	18.302.495	-		-	-	29	18.302.495	16.711.733	1.590.762	-	-
12	PKPNTB	21.992.601	21.992.601	24	16.873.697	-	-	1	56.000	23	16.817.697	16.383.644	434.053	-		24	16.873.697	-		2	859.882	22	16.013.815	15.528.755	485.060	-	-
13	PKPPNTT	28.031.084	28.031.084	28	21.405.683	-	-	-	-	28	21.405.683	21.224.895	180.788	-		28	21.376.062	-		-	-	28	21.376.062	21.162.145	213.917	-	-
14	PKPPMALUKU	25.390.359	25.390.359	27	22.145.971	-		-		27	22.145.971	21.880.067	265.904	-		27	22.145.971	-		-		27	22.145.971	21.879.767	266.204	-	-
15	PKPPMALUKUUTARA	28.039.082	28.039.082	26	23.079.483	-		-		26	23.079.483	23.079.483	-	-		26	23.079.483	-		-		26	23.079.483	23.078.233	1.250	-	-
16	PKPP PAPUA	25.945.436	25.945.436	38	20.883.955	-		14	784.000	24	20.099.955	19.814.844	285.111	-		38	20.883.955	-		6	336.000	32	20.547.955	20.134.844	413.111	-	-
17	PKPPPAPUABARAT	28.637.143	28.637.143	26	23.747.509			1	100.000	25	23.647.509	23.530.065	117.444	-	•	26	23.747.509			1	100.000	25	23.647.509	23.530.065	117.444		-
_	TOTAL	2.673.928.472	2.812.909.502	1.233	1,974,942,259	51	159.136.148	194	102.451.889	905	732,651,220	700.492.503	32.158.717	83	980.703.002	1.254	2.018.409.952	50	166.983.273	163	51,505,253	951	795.971.823	744,821,261	51.150.562	81	1.003.949.603

Catatan:

⁻ Sesuci Surat Edaran Menteri Pekerjaan UmumNorror 07/SEM/2012, pagu RUP memuat pagu seluruh paket kegiatan sesuai DIPA termesuk pekerjaan Administrasi Umumdan Swakelola

⁻ Data paket kontraktual e-Procurement telah termasuk paket pelelangan dini yang masih dalam update data revisi DIPA

Dana Blokir

Dana Blokir

REKAPITULASI DANA BLOKIR TA 2014 DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA STATUS: 29 AGUSTUS 2014

(x Rp 1.000)

NO	DIREKTORAT		BLOKIR		TOTAL	KETERANGAN
NO	DIKENIOKAI	RPM	PLN	TOTAL	PAKET	RETERANGAN
	SATKER PUSAT DAN PROVINSI:	326.715.675	173.245.000	499.960.675	28	
1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM	-	9.700.000	9.700.000	1	
2	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP	-	4.475.000	4.475.000	6	
3	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	305.011.340	98.970.000	403.981.340	15	
4	DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	21.000.000	100.000	21.100.000	2	
5	DIREKTORAT BINAPROGRAM	-	-	-	-	
6	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA	704.335	60.000.000	60.704.335	4	
7	BPPSPAM	-	-	-		
8	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	60.775.000	60.775.000	45	
	- P2KP	-	-	-	-	
	- PPIP	-	-	-		
	- PAMSIMAS	-	-	-		
	- RISE	-	-	-		
	- SANIMAS	-	60.775.000	60.775.000	45	
	TOTAL	326.715.675	234.020.000	560.735.675	73	

Dana Blokir


RINCIAN DANA BLOKIR TA. 2014 DITJEN CIPTA KARYA STATUS: 29 AGUSTUS 2014

x 1.000

\n	FOEL ON HIVD AIGHT DEIGED IA AN		DANA BLOKIR		RENCAN	NA AKAN DIO	CAIRKAN	TOTAL	I/ETE DANGANI
NO.	ESELON II/PAKET PEKERJAAN	RM	PHLN	JUMLAH	RM	PHLN	JUMLAH	PAKET	KETERANGAN
	DIT BANGKIM	305.011.340	98.970.000	403.981.340	-	-	-	15	
1	Pengadaan Kendaraan Roda 2 Operasional Kantor (D.K.I. Jakarta)	35.620	-	35.620			-	1	Belum dilengkapi dokumen Risalah Lelang
2	Perluasan Ruang Arsip Dit. Bangkim Jl. Cipaku V	900.000	-	900.000			-	3	Belum dilengkapi dokumen Pendukung/dok teknis
3	Pengadaan Kendaraan Roda 4/Pick Up Operasional Kantor dan/atau Lapangan (D.K.I. Jakarta)	375.720	-	375.720			-	1	Belum dilengkapi dokumen Risalah Lelang
4	BLM Fisik (Dana Optimalisasi kegiatannya tersebar di Satker daerah)	35.000.000	-	35.000.000			-	1	Belum ada Penetapan SK Desa
5	BLM Fisik (Dana Reguler 2 kegiatannya tersebar di Satker daerah)	208.000.000	-	208.000.000			1	1	Belum ada Penetapan SK Desa
6	BLM Fisik Prov. Lampung	16.000.000	-	16.000.000			-	1	Belum ada Penetapan SK Desa
7	BLM Fisik Prov. Nusa Tenggara Timur	22.000.000	-	22.000.000			-	1	Belum ada Penetapan SK Desa
8	BLM Fisik Prov. Sumatera Barat	4.000.000	-	4.000.000			-	1	Belum ada Penetapan SK Desa
9	BLM Kab. Sangihe dan Sitaro	1.200.000	-	1.200.000			-	1	Dana Optimalisasi
10	Safeguading PPIP	17.500.000	-	17.500.000			-	1	Dana Optimalisasi
11	Manajemen Pengendalian NUSSP	-	8.250.000	8.250.000			-	1	NUSSP / loan belum efektif
12	Pembangunan NUSSP	-	82.500.000	82.500.000			-	1	NUSSP / loan belum efektif
13	Peningkatan Kualitas NUSSP	-	8.220.000	8.220.000			-	1	NUSSP / loan belum efektif

Terima Kasih

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPAN DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2014

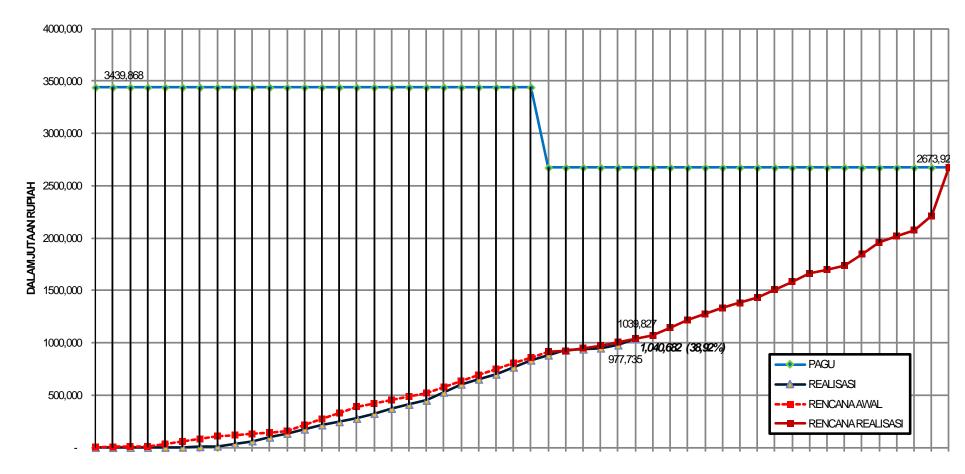

	JA	N	FE	В	M	AR	AF	PR	М	EI	Jl	JN	JI	JL	AC	ST	SE	P	OI	KT	NC	v	DE	ES
	MGII	MGIV	MGII	MGIV	MGII	MGIV	MGII	MGIV	MGII	MGIV	MGII	MGIV	MGII	MGIV	MGII	MGIV	MGII	MGIV	MGII	MGIV	MGII	MGIV	MGII	MGIV
RENCANA AWAL (%)	0.17	0.34	1.62	3.21	3.73	4.56	7.94	11.32	13.24	15.15	18.47	21.79	25.00											
RENC. REALISASI (%)													-	34.48	36.49	38.89	42.79	47.63	53.56	59.27	63.52	69.09	77.74	100.00
REALISASI (%)	-	0.05	0.08	0.37	1.80	3.91	6.25	8.06	10.84	13.10	17.57	20.34	24.25	34.77	35.49	38.92	-	-	-	-	-	-	-	-

Progres Penyerapan TA 2014 Dit. Bangkim

	KODE		RUPIAH			RENCANA REAL 1 SEPTEMBER			REA	LISASI			DEVIAS	il
NO	SATKER	NAMA DIREKTORAT	MURNI	PLN	PAGU	KEUANGAN	N	RUPIAH		T0741	KEU	FISIK	KEUANG	AN
						(RP)	%	MURNI	PHLN	TOTAL	%	%	(RP)	%
	*		*	*	*	*	*	*	*	*				*
	A.	SATKER PUSAT	1.663.316.126	192.268.000	1.855.584.126	615.872.845	33.19	554.002.763	24.270.757	578.273.521	31.16	32.16	(37.599.325)	(2.03)
1	452771	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	68.336.324	-	68.336.324	32.911.960	48.16	28.526.003		28.526.003	41.74	44.70	(4.385.957)	(6.42)
2	488822	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN STRATEGIS	21.083.987	79.018.000	100.101.987	39.163.389	39.12	6.039.805	12.845.846	18.885.651	18.87	18.38	(20.277.738)	(20.26)
3	493181	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN STRATEGIS	1.114.510.588	98.970.000	1.213.480.588	516.600.636	42.57	500.529.573	-	500.529.573	41.25	42.66	(16.071.063)	(1.32)
4	505138	PEMBINAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	459.385.227	14.280.000	473.665.227	27.196.860	5.74	18.907.381	11.424.911	30.332.293	6.40	6.38	3.135.433	0.66
	В.	SATKER PROVINSI	818.344.346	-	818.344.346	455.522.755	55.66	462.408.630	-	462.408.630		64.55	6.885.875	0.84
		WILAYAH1	381.190.660	-	381.190.660	196.796.288	51.63	214.849.837		214.849.837		63.18	18.053.549	4.74
1	486479	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN NAD	22.293.065	-	22.293.065	11.732.554	52.63	9.619.167	-	9.619.167	43.15	66.06	(2.113.387)	(9.48)
2	486485	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN SUMATERA UTARA	27.444.591	-	27.444.591	4.847.615	17.66	4.224.682	-	4.224.682	15.39	22.86	(622.933)	(2.27)
3	486491	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA BARAT	23.905.079	-	23.905.079	15.308.871	64.04	17.343.781	-	17.343.781	72.55	75.35	2.034.911	8.51
4	486505	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN RIAU	26.361.836	-	26.361.836	13.975.203	53.01	17.117.977	-	17.117.977	64.93	69.80	3.142.774	11.92
5	493336	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN KEPULAUAN RIAU	22.834.462	-	22.834.462	14.673.027	64.26	16.098.577	-	16.098.577	70.50	85.34	1.425.550	6.24
6	486511	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAMBI	25.674.297	-	25.674.297	14.474.333	56.38	15.251.536	-	15.251.536	59.40	62.70	777.203	3.03
7	486686	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BENGKULU	22.290.294	-	22.290.294	14.437.632	64.77	17.879.763	-	17.879.763	80.21	85.35	3.442.131	15.44
8	486520	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA SELATAN	34.270.996	-	34.270.996	16.597.618	48.43	20.698.668	-	20.698.668	60.40	69.67	4.101.050	11.97
9	487723	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BANGKA BELITUNG	19.649.137	-	19.649.137	13.110.733	66.72	13.486.947	-	13.486.947	68.64	84.05	376.214	1.91
10	1	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN LAMPUNG	28.633.860	-	28.633.860	15.966.962	55.76	20.942.051	-	20.942.051	73.14	78.17	4.975.089	17.37
11	1	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BANTEN	21.737.915	-	21.737.915	3.238.304	14.90	4.026.353	-	4.026.353			788.049	3.63
12	486432	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA BARAT	26.897.679	-	26.897.679	12.330.215	45.84	9.732.790	-	9.732.790	36.18	38.79	(2.597.425)	(9.66)
13		PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA TENGAH	30.360.392	-	30.360.392	16.248.302	53.52	18.922.510	-	***************************************		68.66	2.674.207	8.81
14	486454	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DI. YOGYAKARTA	21.789.115	-	21.789.115	17.983.596	82.53	20.101.350	-	20.101.350	92.25	93.70	2.117.753	9.72
15	486460	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA TIMUR	27.047.942		27.047.942	11.871.322	43.89	9.403.685	-	9.403.685	34.77	36.40	(2.467.637)	(9.12)

Progres Penyerapan TA 2014 Dit. Bangkim

	KODE		RUPIAH			RENCANA REAL 1 SEPTEMBER			REA	NLISASI			DEVIAS	i
NO	SATKER	NAMA DIREKTORAT	MURNI	PLN	PAGU	KEUANGA	١	RUPIAH		T0741	KEU	FISIK	KEUANG	AN
						(RP)	%	MURNI	PHLN	TOTAL	%	%	(RP)	%
		WILAYAH2	437.153.686		437.153.686	258.726.468	59.18	247.558.793	•	247.558.793	56.63	65.74	(11.167.674)	(2.55)
16	486542	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN KALIMANTAN BARAT	4.783.656	-	4.783.656	2.094.502	43.78	2.011.191	-	2.011.191	42.04	59.91	(83.311)	(1.74)
17	486551	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN TENGAH	24.612.132	-	24.612.132	16.470.253	66.92	19.542.654	-	19.542.654	79.40	88.88	3.072.400	12.48
18	486567	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN SELATAN	22.466.871	-	22.466.871	13.718.579	61.06	12.304.091	-	12.304.091	54.77	54.58	(1.414.488)	(6.30)
19	486573	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR	22.185.036	-	22.185.036	13.109.762	59.09	10.092.672	-	10.092.672	45.49	56.21	(3.017.090)	(13.60)
20	486582	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN SULAWESI UTARA	57.275.669	-	57.275.669	26.684.013	46.59	24.521.888	-	24.521.888	42.81	58.13	(2.162.126)	(3.77)
21	487748	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN GORONTALO	20.615.166	-	20.615.166	8.230.711	39.93	9.665.091	-	9.665.091	46.88	52.39	1.434.380	6.96
22	486598	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI TENGAH	18.832.686	-	18.832.686	8.081.583	42.91	4.382.393	-	4.382.393	23.27	30.55	(3.699.190)	(19.64)
24	486602	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI SELATAN	28.735.136	-	28.735.136	19.404.384	67.53	18.560.375	-	18.560.375	64.59	79.33	(844.010)	(2.94)
25	452796	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI BARAT	22.216.873	-	22.216.873	13.802.934	62.13	13.047.344	-	13.047.344	58.73	68.22	(755.590)	(3.40)
23	486618	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI TENGGARA	33.787.996	-	33.787.996	20.808.857	61.59	20.145.321	-	20.145.321	59.62	71.39	(663.536)	(1.96)
26	486649	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BALI	23.606.760	-	23.606.760	13.469.378	57.06	12.887.531	-	12.887.531	54.59	70.71	(581.847)	(2.46)
27	486655	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA BARAT	21.992.601	_	21.992.601	9.683.682	44.03	8.605.534	-	8.605.534	39.13	41.11	(1.078.148)	(4.90)
28	486661	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN NUSA TENGGARA TIMUR	28.031.084	-	28.031.084	15.834.855	56.49	13.292.186	-	13.292.186	47.42	54.18	(2.542.669)	(9.07)
29	486624	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN MALUKU	25.390.359	-	25.390.359	16.962.438	66.81	21.489.128	-	21.489.128	84.63	89.34	4.526.691	17.83
30	486630	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN MALUKU UTARA	28.039.082	-	28.039.082	25.052.512	89.35	22.982.873	-	22.982.873	81.97	83.24	(2.069.639)	(7.38)
31	486670	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN PAPUA	25.945.436	-	25.945.436	14.738.485	56.81	13.156.473	-	13.156.473	50.71	62.09	(1.582.012)	(6.10)
32	493769	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN PAPUA BARAT	28.637.143	-	28.637.143	20.579.539	71.86	20.872.050	-	20.872.050	72.88	80.10	292.512	1.02
		TOTAL	2.481.660.472	192.268.000	2.673.928.472	1.071.395.601	40.07	1.016.411.394	24.270.757	1.040.682.151	38.92	42.07	(30.713.450)	(1.15)

Pelaksanaan Pelelangan Direktorat Pengembangan Permukiman

PAKET KEGIATAN TA 2014 MELALUI e-PROCUREMENT DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN PAGU PAKET > Rp 50 JUTA

STATUS: 28 AGUSTUS 2014, 08:00 WIB

(x Rp 1000)

PAKET KEGIATAN TA 2014									PAKET	MULTIYEARS											
NO	NAMA SATUAN KERJA	PAGU DIPA	PAGU RUP	Pagu Kontraktual	JUMLAH			PERSIAPAI	N(1)		PRO	SES LEL	ANG				TERKONTRA	NK (10)		LAN	NJUTAN (M)
110	TOTAL CATALOGY	TAGOBITA	1 AGG NGI	(e-Procurement)	PAKET	TOTAL PAKET	TOTAL PAGU PAKET	PAGU	TOTAL		AH PAKE	T(2-9)	PAGU PROSES	JUN	ILAH PAH	ŒT	PAGU	NII AI KONTRAK	SISA KONTRAK	PAKET	RP
								PERSIAPAN	PAKET	FISIK	NON	TOTAL	LELANG	FISIK	NON	TOTAL	TERKONTRAK	TEL-A TOTTION	CICATICATIVAL	174	i u
_										_											
A.	SATUAN KERJA PUSAT	1.855.584.126	1.976.683.570	1.352.944.786	233	152	348.995.183	158.611.798	40	2	27	29	23.753.839	15	68	83	166.629.546	155.637.900	10.991.646	81	1.003.949.603
1	DIT. BANGKIM	68.336.324	67.806.424	19.523.538	20		19.523.538	-	-	1	1	2	1.350.000	-	18	18	18.173.538	16.500.284	1.673.254	-	-
2	PKP PERDESAAN STRATEGIS	100.101.987	203.768.792	87.438.000	20	20	87.438.000	-	-	-	1	1	11.706.000	1	18	19	75.732.000	75.193.537	538.463	-	-
3	PKP PERKOTAAN STRATEGIS	1.213.480.588	1.231.443.127	1.221.163.248	179	101	228.993.645	157.261.798	38	1	25	26	10.697.839	14	23	37	61.034.008	53.225.058	7.808.950	78	992.169.603
4	PPIP	473.665.227	473.665.227	24.820.000	14	11	13.040.000	1.350.000	2	-	•	•	-	-	9	9	11.690.000	10.719.022	970.979	3	11.780.000
B.	SATUAN KERJA PROVINSI WILAYAH I	381.190.660	385.010.594	302.612.260	530	530	302.612.260	5.221.475	11	13	67	80	16.640.272	210	229	439	280.750.513	257.810.630	22.939.883	-	-
1	PKPP NAD	22.293.065	22.293.065	16.421.980	18	18	16.421.980	-	-	-	-	-	-	8	10	18	16.421.980	16.257.690	164.290		-
2	PKPP SUMATERA UTARA	27.444.591	27.444.591	23.961.986	40	40	23.961.986	1.421.000	1	1	3	4	894.904	6	29	35	21.646.082	20.687.289	958.793		-
3	PKP SUMATERA BARAT	23.905.079	23.905.079	21.710.061	31	31	21.710.061	-	-	-	11	11	616.000	11	9	20	21.094.061	17.479.872	3.614.189		-
4	PKPP RIAU	26.361.836	26.361.836	16.724.208	25	25	16.724.208	-	-	-	-	-	-	13	12	25	16.724.208	15.816.550	907.658	-	-
5	PKPP KEPULAUAN RIAU	22.834.462	22.834.462	18.876.743	28	28	18.876.743	-	-	-	-	-	-	12	16	28	18.876.743	17.664.121	1.212.622	-	-
6	PKPJAMBI	25.674.297	25.674.297	23.100.509	34	34	23.100.509	-	-	-	-	-	-	17	17	34	23.100.509	15.792.976	7.307.533	-	-
7	PKP BENGKULU	22.290.294	22.140.590	18.104.722	22	22	18.104.722	-	-	-	1	1	56.000	16	5	21	18.048.722	17.536.755	511.967	-	-
8	PKP SUMATERA SELATAN	34.270.996	34.492.972	22.840.520	30	30	22.840.520	-	-	-	-	-	-	15	15	30	22.840.520	21.977.379	863.141	-	-
9	PKP BANGKA BELITUNG	19.649.137	19.649.137	16.591.220	30	30	16.591.220	-	-	-	-	-	-	12	18	30	16.591.220	15.422.860	1.168.360	-	-
10	PKP LAMPUNG	28.633.860	28.991.970	18.572.479	30	30	18.572.479	56.000	1	-	2	2	112.000	13	14	27	18.404.479	17.946.739	457.740	-	-
11	PKP BANTEN	21.737.915	25.076.890	21.238.343	45	45	21.238.343	3.338.975	6	11	17	28	10.249.368	8	3	11	7.650.000	6.823.477	826.523	-	-
12	PKP JAWA BARAT	26.897.679	26.897.679	21.779.522	26	26	21.779.522	-	-	1	3	4	3.032.000	9	13	22	18.747.522	17.137.813	1.609.709	-	-
13	PKP JAWA TENGAH	30.360.392	30.410.964	23.783.787	72	72	23.783.787	-	-	-	-	-	-	37	35	72	23.783.787	23.257.085	526.702	-	-
14	PKP DI YOGYAKARTA	21.789.115	21.789.120	17.648.300	41	41	17.648.300	168.000	1		-	-	-	22	18	40	17.480.300	16.814.924	665.376	•	-
15	PKP JAWA TIMUR	27.047.942	27.047.942	21.257.880	58	58	21.257.880	237.500	2	-	30	30	1.680.000	11	15	26	19.340.380	17.195.101	2.145.279	-	-

Daftar Paket e-Procurement BELUM LELANG TA 2014 Status 29 Agustus 2014, Pukul 08.00

No.	Uraian Permasalahan	Nama Satuan Kerja	Jumlah Paket	Nama Paket	Pagu Paket TA 2014	HPS	Status Lelang	Keterangan
			*					
Α	REGULER		56		165.433.273	165.433.273		
	Revisi DIPA							
b	Revisi POK							
С	Perubahan Nomenklatur							
d	ReviewDED							
е	DED belum siap		2		448.455	448.455		
		PKP PERKOTAAN STRATEGIS	2		448.455	448.455		
				MK Pembangunan Rusunawa Kec. Jatisari Kab. Bandung 3 -	381.370	381.370	1	Proses Lelang tahap pengumuman pemenang, Kontrak 21 Juli 2014 dan belum mengupdate di eproc
				MK Pembangunan Rusunawa Kws Kab. Blora	67.085	67.085	1	Pengumuman 15 Agustus 2014, rencana kontrak 6 Oktober 2014.
f	Ketersediaan Lahan/Kesiapan Lahan							
g	Belum selesainya proses serah terima aset							
h	Proses Penyelesaian Dokumen Lelang		52		163.507.818	163.507.818		
		PKP PERKOTAAN STRATEGIS	35		156.613.343	156.613.343		
				Pembangunan infrastruktur kawasan permukiman kumuh P. Madura	3.750.000	3.750.000	1	Akan dialihkan ke Pemda melalui mekanisme revisi DIPA
				Pembangunan Rusunawa Ul Kota Depok	1.896.000	1.896.000	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				MK Pembangunan Rusunawa Ul Kota Depok	83.736	83.736	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Pembangunan Rusunawa ITB Kota Bandung	1.976.880	1.976.880	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Optimalisasi Pembangunan Rusunawa Provinsi Lampung	1.534.200	1.534.200	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Pembangunan Rusunawa Kec. Sukorejo Kota Blitar	1.988.376	1.988.376	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Manajemen Pengendalian	8.250.000	8.250.000	1	PHLN, akan dihapus (drop) melalui revisi DIPA
				Pembangunan Rusunawa Kec.Gadingrejo Kab. Pasuruan	3.469.593	3.469.593	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Pembangunan Rusunawa Romokalisari Kota Surabaya	2.052.720	2.052.720	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Pengadaan AC dan Furniture Rusunawa Rempoa Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan	3.963.699	3.963.699	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Pembangunan Rusunawa Univ. Andalas Kota Padang	2.040.000	2.040.000	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Pembangunan Rusunawa Kws Kota Tegal	1.691.640	1.691.640	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Peningkatan Kualitas	8.220.000	8.220.000	1	PHLN, akan dihapus (drop) melalui revisi DIPA
				Optimalisasi Pembangunan Rusunawa Parung Panjang Kab. Bogor	3.877.188	3.877.188		Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Supervisi infrastruktur kawasan permukiman kumuh	511.738	511.738	1	Akan dialihkan ke Pemda melalui mekanisme revisi DIPA
				Pembangunan Rusunawa UGM Kab. Sleman	3.236.512	3.236.512	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				MK Pembangunan Rusunawa UNISMA Kota Malang	67.085	67.085	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Pembangunan Rusunawa UNSIMA Kota Malang	2.001.480	2.001.480	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				MK Pembangunan Rusunawa Kota Balikpapan	67.085	67.085	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Pembangunan Rusunawa Kota Balikpapan	2.090.000	2.090.000	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Pembangunan Rusunawa Kec. Pringsurat Kab. Temanggung	2.992.080	2.992.080	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014

Daftar Paket e-Procurement BELUM LELANG TA 2014 Status 29 Agustus 2014, Pukul 08.00

No.	Uraian Permasalahan	Nama Satuan Kerja	Jumlah Paket	Nama Paket	Pagu Paket TA 2014	HPS	Status Lelang	Keterangan
*								
				Pembangunan infrastruktur kawasan permukiman kumuh kota Sorong	4.500.000	4.500.000	1	Akan dialihkan ke Pemda melalui mekanisme revisi DIPA
				Pembangunan Rusunawa Kota Surakarta	1.989.120	1.989.120	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				MK Pembangunan Rusunawa Kawasan Kota Bekasi	67.085	67.085	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Pembangunan Rusunawa Kawasan Kota Bekasi	1.896.000	1.896.000	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				MK Pembangunan Rusunawa Kota Jayapura	83.736	83.736	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Pembangunan Rusunawa Kws Kab. Blora	1.772.040	1.772.040	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (NUSSP-2)	82.500.000	82.500.000	1	PHLN, akan dihapus (drop) melalui revisi DIPA
				MK Pembangunan Rusunawa Kota Mataram	67.085	67.085	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Pembangunan Rusunawa Kota Jayapura	2.897.400	2.897.400	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Pembangunan Rusunawa Kota Mataram	2.099.020	2.099.020	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Pembangunan Rusunawa Kab. Bogor	1.896.000	1.896.000	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Pembangunan Rusunawa Pesantren Bustanul Ulum A-Ghozali Kec. Wuluhan Kab. Jember	908.760	908.760	1	Rencana lelang tanggal 29 Agustus 2014
				Pengadaan Komputer PC dan Printer	110.000	110.000	1	Pengumuman 15 Agustus 2014, rencana kontrak 6 Oktober 2014.
				MK Pembangunan Rusunawa Kab. Bogor	67.085	67.085	1	
		PKP KALIMANTAN BARAT	8		3.150.000	3.150.000		
				02 - Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan	900.000	900.000	1	
				01 - Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan	850.000	850.000	1	
				29 - Pengawasan / Supervisi Konstruksi Pelaksanaan Peningkatan	100.000	100.000	1	
				23 - Pengawasan / Supervisi Konstruksi Pelaksanaan Peningkatan	100.000	100.000	1	
				32 - Pengawasan / Supervisi Konstruksi Pelaksanaan Peningkatan	150.000	150.000	1	
				22 - Pengawasan / Supervisi Konstruksi Pelaksanaan Peningkatan	100.000	100.000	1	
-				30 - Pengawasan / Supervisi Konstruksi Pelaksanaan Peningkatan	100.000	100.000	1	
-				03 - Penyusunan Rencana Pembangunan Dan Pengembangan	850.000	850.000	1	
-		PKPJAWA TIMUR	2	oo i a yaaan aan aa a	237.500	237.500	-	
-		THE OATER THEOR	_	Konsultan Individual Ahli GIS	76.500	76.500	1	
\dashv				Konsultan Individual Surveyor	161.000	161.000	1	
-		PKP BANTEN	6	ronsultai i ii dividuai Sulveyoi	3.338.975	3.338.975		
-		THE BANGEY	•	SUPERVISI PENINGKATAN JALAN POROS DESA DESAHARIANG	100.000	100.000	1	
-				PENINGKATAN JALAN PRODUKSI, DESAKRONJO KEC. KRONJO	850.000	850.000	1	
				KAB. TANGERANG				
				PENINGKATAN JALAN POROS DESA, DESA HARIANG KEC. SOBANG KAB. LEBAK	1.348.975	1.348.975	1	
				PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DESABINUANG KEC. BINUANG KAB. SERANG	900.000	900.000	1	
				SUPERVISI PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN DESA BINUANG KEC, BINUANG KAB, SERANG	80.000	80.000	1	
				SUPERVISI PENINGKATAN JALAN PRODUKSI, DESA KRONJO KEC. KRONJO	60.000	60.000	1	
\dashv		PKP DI YOGYAKARTA	1	· - · - · - ·	168.000	168.000		
\dashv				Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK)	168.000	168.000	1	
, l	Kontrak Individual		2		1.477.000	1.477.000		
	- Fasilitator		1		1.421.000	1.421.000		
		PKPP SUMATERA UTARA	1		1.421.000	1.421.000		
\dashv		JOHN LIVE OF AN		Gaji Fasilitator	1.421.000	1.421.000	1	Bukan paket kontraktual
	- Tenaga Ahli		1		56.000	56.000		
	- va rougus - 41	PKP LAMPUNG	1		56.000	56.000		
\dashv				Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAVIK) 2	56.000	56.000	1	Pengumuman 15 Agustus 2014, rencana kontrak 6 Oktober 2014.
_				1 0 mg 27 1 11 11 m mg 01 10 1 1 1 m mg 01 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1	33.000	33.000	· '	. o. garrar ar 107 gadab 2014, for localization literate Ontober 2014.

Daftar Paket e-Procurement BELUM LELANG TA 2014 Status 29 Agustus 2014, Pukul 08.00

No.	Uraian Permasalahan	Nama Satuan Kerja	Jumlah Paket	Nama Paket	Pagu Paket TA 2014	HPS	Status Lelang	Keterangan
	*		*	1		*		*
j	Menunggu Paket Lain							
k	Diblokir (Tanda Bintang) oleh Ditjen		_					
	Anggaran							
	- Loan belum efektif/menunggu loan							
	agreement							
	- Menunggu NOL lelang							
	- Menunggu Izin Multiyears							
	- Dokumen RPIJM belum tersedia							
	- Menunggu MoU dengan Pemda							
	- Menunggu persetujuan BMN dari Kemenkeu							
	- Cadangan Tanggap Darurat							
	- Perubahan Paket							
1	Keterbatasan SDM POKJA							
В	APBN-P		-					
С	Sudah Lelang				-	-		
а	Proses Lelang							
b	Terkontrak							
D	Dibatalkan		3		1.550.000	1.550.000		
		PPIP	2		1.350.000	1.350.000		
				Publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) PPIP (Televisi) TA2014	850.000	850.000		Masuk pagu penghematan, Satker belum mengupdate eproc menjadi tidak tayang
				Publikasi Iklan Layanan Masyarakat (ILM) PPIP (Radio) T.A. 2014	500.000	500.000	1	Masuk pagu penghematan, Satker belum mengupdate eproc menjadi tidak tayang
		PKP PERKOTAAN	1		200.000	200.000		
		STRATEGIS						
				(02) Supervisi Pembangunan PSD di Kws Rusunawa Kec. Kebomas Kab. Gresik	200.000	200.000	1	Masuk pagu penghematan, Satker belum mengupdate eproc menjadi tidak tayang
Е	Bukan Paket Kontraktual				-			
	Paket ganda							
	Salah input							
	TOTAL		59		166.983,273	166,983,273		

Verifikasi Pengisian NPWP

					Konstruksi			Barang		Konsultansi			
				Total Pkt	Pkt	NPWP	Total Pkt	Pkt	NPWP	Total Pkt	Pkt	NPWP	NPWP
No	0	Kode	Satker	Kontrak	Terkontrak	Rekanan	Kontrak	Terkontrak	Rekanan	Kontrak	Terkontrak	Rekanan	Tenaga Ahli
		Α	SATKER PUSAT										
	1	5452771	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1	0	0	0	0	0	21	18	18	18
	2	5488822	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN STRATEGIS	0	0	0	2	1	1	19	10	10	10
	3	5493181	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN STRATEGIS	79	53	51	2	1	1	87	51	41	41
Ŀ	4		PEMBINAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	0	0	0	0	0	0	14	12	12	12
			SATKER PROVINSI										
			WILAYAH II										
:	5	5486479	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN NAD	8	8	8	0	0	0	10	10	10	10
Ľ	6	5486485	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN SUMATERA UTARA	7	6	6	0	0	0	32	10	10	10
	7		PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA BARAT	11	11	11	0	0	0	27	14	14	14
L	8	5486505	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN RIAU	13	13	13		0	0	12	11	11	11
	9	5493336	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN KEPULAUAN RIAU	11	11	11	·	0	0	16	2	1	0
1	0		PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAMBI	17	17	17		0	0	17	10	10	10
1	1	5486686	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BENGKULU	17	16	16		0	0	14	14		14
1:	2	5486520	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA SELATAN	15	15	15	0	0	0	15	13	13	13
1	3	5487723	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BANGKA BELITUNG	12	12	12	1	1	1	18	13	13	13
1.	4	5486536	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN LAMPUNG	13	13	12	0	0	0	28	13	13	13
1:	5	5487732	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BANTEN	19	6	3	0	0	0	27	3	3	3
1	6	5486432	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA BARAT	10	10	10	0	0	0	16	14	14	14
1	7	5486448	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA TENGAH	37	37	37	0	0	0	37	34		34
18	8	5486454	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DI. YOGYAKARTA	23	23	23	0	0	0	29	26	26	26
1	9	5486460	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA TIMUR	11	11	11	0	0	0	47	15	15	15

Verifikasi Pengisian NPWP

				Konstruksi			Barang		Konsultansi			
			Total Pkt	Pkt	NPWP	Total Pkt	Pkt	NPWP	Total Pkt	Pkt	NPWP	NPWP
No	Kode	Satker	Kontrak	Terkontrak	Rekanan	Kontrak	Terkontrak	Rekanan	Kontrak	Terkontrak	Rekanan	Tenaga Ahli
		SATKER PROVINSI										
		WILAYAH II										
20	5486551	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN TENGAH	10	10	10	0	0	0	11	11	11	1
21	5486567	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN SELATAN	8	8	8	0	0	0	10	10	10	10
22	5486573	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR	7	7	7	0	0	0	17	9	9	9
23	5486582	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN SULAWESI UTARA	31	31	20	0	0	0	34	21	13	13
24	5487748	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN GORONTALO	9	8	8	0	0	0	17	10	10	10
25	5486598	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI TENGAH	7	7	7	0	0	0	21	8	8	7
26	5486602	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI SELATAN	12	12	12	0	0	0	35	12	12	! 12
27	5452796	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI BARAT	11	11	1	0	0	0	12	12	3	1
28	5486618	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI TENGGARA	13	13	13	0	0	0	26	9	9	9
29	5486649	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BALI	9	9	9	3	3	0	10	10	10	10
30	5486655	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA BARAT	10	10	10	0	0	0	14	13	13	0
31	5486661	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN NUSA TENGGARA TIMUR	15	15	14	0	0	0	13	13	13	13
32	5486624	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN MALUKU	8	8	8	0	0	0	9	9	9	9
33	5486630	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN MALUKU UTARA	12	12	11	1	1	1	14	14	7	6
34	5486670	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN PAPUA	11	11	10	0	0	0	27	12	12	12
		Total	477	434	404	9	7	4	756	466	431	403

Pelaporan Foto dan Koordinat TA 2014

NO	SATUAN KERJA	PELAPORAN KOORDINAT	PELAPORAN FOTO
140	SATKER PUSAT	ROORDINAT	1010
1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	0	0
2	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN STRATEGIS	0	0
3	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN STRATEGIS	0	0
4	PEMBINAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	0	0
	SATKER PROVINSI		
	WILAYAHI		
5	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN NAD	17	17
6	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN SUMATERA UTARA	0	0
7	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA BARAT	10	10
8	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN RIAU	12	13
9	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN KEPULAUAN RIAU	1	22
10	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAMBI	0	0
11	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BENGKULU	30	30
12	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA SELATAN	13	14
13	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BANGKA BELITUNG	21	21
14	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN LAMPUNG	26	29
15	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BANTEN	22	22
16	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA BARAT	0	0
17	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA TENGAH	11	12
18	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DI. YOGYAKARTA	24	25
19	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA TIMUR	12	12

Pelaporan Foto dan Koordinat TA 2014

	SATKER PROVINSI		
	WILAYAH II		
20	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN KALIMANTAN BARAT	0	0
21	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN TENGAH	1	14
22	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN SELATAN	8	8
23	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR	0	0
24	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN SULAWESI UTARA	11	11
25	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN GORONTALO	7	7
26	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI TENGAH	0	0
27	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI SELATAN	14	14
28	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI BARAT	16	16
29	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI TENGGARA	0	0
30	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BALI	14	16
31	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA BARAT	1	6
32	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN NUSA TENGGARA TIMUR	6	9
33	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN MALUKU	5	5
34	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN MALUKU UTARA	8	8
35	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN PAPUA	9	9
36	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN PAPUA BARAT	4	4
	TOTAL	303	354

Pelaporan Tenaga Kerja Direktorat Pengembangan Permukiman TA 2014

No.	Satuan Kerja	Tenaga (Perem	•	Tenaga Pr	ofesional	Tenaga Profe		Pekerja		Jumlah	
140.	Jatuan Kenja	Terlibat	Bulan	Terlibat	Bulan	Terlibat	Bulan	Terlibat	Bulan	Terlibat	Bulan
		(org)	(OB)	(org)	(OB)	(org)	(OB)	(org)	(OB)	(org)	(OB)
	PUSAT										
1	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	18	27	46	52	83	142	65	148	194	342
2	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERDESAAN STRATEGIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN STRATEGIS	40	254	514	3.447	526	3.563	8.538	49.317	9.578	56.327
4	PEMBINAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	3	12	15	60	1	4	3	12	19	76
	WILAYAH I										
5	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN NAD	53	59	159	174	83	92	125	128	367	394
6	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN SUMATERA UTARA	14	27	23	23	36	84	3	3	62	110
7	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA BARAT	1	1	0	0	2	2	1	1	3	3
8	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN RIAU	4	5	135	440	31	137	171	843	337	1.420
9	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN KEPULAUAN RIAU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAMBI	3	12	45	143	59	214	245	776	349	1.133
11	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BENGKULU	0	0	30	150	60	300	240	1.200	330	1.650
12	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SUMATERA SELATAN	4	16	25	97	17	65	161	541	203	703
13	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BANGKA BELITUNG	0	0	0	0	24	144	272	1.645	296	1.789
14	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN LAMPUNG	110	207	110	220	108	217	242	484	460	921
15	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BANTEN	48	198	42	174	32	141	174	757	248	1.072
16	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA TENGAH	17	101	105	379	11	74	53	421	169	874
18	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DI. YOGYAKARTA	82	493	27	177	134	396	969	1.916	1.130	2.489
19	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN JAWA TIMUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pelaporan Tenaga Kerja Direktorat Pengembangan Permukiman TA 2014

No.	Satuan Kerja	Tenaga (Peren	•	Tenaga Profesional		Tenaga Semi Profesional		Pekerja		Jumlah	
140.	Satuali Neija	Terlibat	Bulan	Terlibat	Bulan	Terlibat	Bulan	Terlibat	Bulan	Terlibat	Bulan
		(org)	(OB)	(org)	(OB)	(org)	(OB)	(org)	(OB)	(org)	(OB)
	WILAYAH II										
20	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN KALIMANTAN BARAT	13	56	0	0	9	39	48	204	57	243
21	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN TENGAH	0	0	60	60	0	0	218	210	278	270
22	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN SELATAN	56	141	105	293	73	198	94	194	272	685
23	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN KALIMANTAN TIMUR	1	1	2	2	1	1	12	12	15	15
24	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN SULAWESI UTARA	0	2	0	76	0	46	0	405	0	527
25	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN GORONTALO	16	45	50	156	49	147	34	110	133	413
26	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI SELATAN	0	0	88	148	56	104	387	770	531	1.022
28	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI BARAT	139	298	108	212	219	461	72	128	399	801
29	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI TENGGARA	0	0	27	27	56	56	86	86	169	169
30	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN BALI	55	183	87	215	48	186	211	829	346	1.230
31	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN NUSA TENGGARA BARAT	97	222	99	236	136	240	205	309	440	785
32	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN NUSA TENGGARA TIMUR	20	20	20	20	40	40	74	74	134	134
33	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN MALUKU	3	3	27	117	85	358	185	1.395	297	1.870
34	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN MALUKU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN PAPUA	0	50	119	186	39	187	176	440	334	813
36	PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERBATASAN PAPUA BARAT	7	7	6	6	6	6	0	0	12	12
